BAB

1

Why Project Management?

Pinto, Project Management: Achieving Competitive Advantage, 6th ed.

Manajemen Bisnis · Pertemuan 1

PETA SESI

Empat hal yang harus terbawa keluar kelas

01

Proyek vs proses

Fondasi seluruh mata kuliah

02

Definisi PMI

Temporary dan unique

03

Project life cycle

Empat tahap dan dinamikanya

04

Kriteria sukses

Dari triple ke quadruple constraint

Maturity model dan employability skills: tugas baca mandiri.

AKTIVITAS A1 · MAHASISWA BEKERJA

Tulis satu proyek

8
menit

Tulis satu kegiatan yang menurut Anda adalah sebuah proyek,
di organisasi mana pun yang Anda kenal.

Satu baris saja. Jangan pikirkan definisinya dulu.

Empat orang maju dan menuliskannya di papan. Contoh-contoh ini kita pakai lagi nanti.

KONSEP · LO 1.2

Definisi proyek menurut PMI

> *A temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result.*

TEMPORARY

Ada titik awal dan titik akhir. Bubar setelah tujuannya tercapai.

UNIQUE

Bukan pengulangan. Hasilnya belum pernah dibuat persis seperti itu.

Dua kata kunci. Sisanya turunan.

KONSEP · LO 1.2 · HLM. 4

Lima elemen definisi proyek

1. Kompleks dan sekali jalan
2. Dibatasi anggaran, jadwal, dan sumber daya
3. Punya tujuan yang jelas
4. Berorientasi pelanggan
5. Lintas fungsi dalam organisasi

Kelima poin ini tetap di papan sampai akhir sesi.

AKTIVITAS A2 · MAHASISWA BEKERJA

20 menit

Proyek atau proses?

Kelompok bertiga. Tandai P atau O untuk tiap kegiatan, dan tulis satu kriteria dari Tabel 1.1 sebagai alasan.

- Membuka gerai ke-51 sebuah jaringan kopi
- Menyeduh dan menjual kopi harian di gerai itu
- Migrasi sistem akademik kampus ke platform baru
- Layanan helpdesk IT harian
- Menyusun laporan keuangan bulanan
- Menyiapkan audit ISO pertama perusahaan
- Kampanye kuliah umum tahunan (tahun ke-8)

KUNCI · DIBUKA SETELAH AKTIVITAS

Proyek atau proses — kunci

P	**Gerai ke-51**	Unik dari sisi lokasi dan perizinan
O	**Menyeduh kopi harian**	Repetitif
P	**Migrasi sistem akademik**	Sekali jalan, lintas fungsi
O	**Helpdesk IT harian**	Berkelanjutan, tanpa titik akhir
O	**Laporan keuangan bulanan**	Siklus berulang
P	**Audit ISO pertama**	Pertama kali, ada tanggal akhir
?	**Kuliah umum tahunan ke-8**	Ini yang kita debatkan

Batasnya spektrum, bukan garis tegas. Itulah gunanya punya lebih dari satu kriteria.

KONSEP · TABEL 1.1

Proses dan proyek berjalan dengan logika berbeda

PROSES

- Produk atau proses berulang
- Banyak tujuan sekaligus
- Berkelanjutan
- Anggota relatif homogen
- Kepastian biaya dan jadwal lebih tinggi
- Menopang status quo

PROYEK

- Produk atau proses baru
- Satu tujuan
- Sekali jalan, umur terbatas
- Anggota lebih heterogen
- Ketidakpastian lebih tinggi
- Mengganggu status quo

Proyek sulit justru karena kekuatannya: ia melanggar praktik yang sudah mapan.

AKTIVITAS A3 · MAHASISWA BEKERJA

Uji contoh Anda sendiri

14
menit

Ambil satu kegiatan dari papan. Uji terhadap lima elemen definisi, satu per satu.

Laporan Anda cukup satu kalimat:

Elemen mana yang tidak terpenuhi?

Kalau semuanya terpenuhi, elemen mana yang paling lemah?

KONSEP · LO 1.1 · CLELAND

Lima tekanan yang mendorong organisasi ke arah proyek

1

Siklus hidup produk memendek

Dominasi bertahun-tahun sudah tidak ada

2

Jendela peluncuran sempit

Telat beberapa minggu, jadi produk kelas dua

3

Produk makin kompleks

Tuntutan teknis terus naik

4

Pasar global

Pesaing dan pelanggan baru sekaligus

5

Inflasi rendah

Laba dicari dari efisiensi, bukan kenaikan harga

Pertanyaan cepat: produk atau layanan Indonesia mana yang siklus hidupnya jelas memendek?

AKTIVITAS A4 · MAHASISWA BEKERJA

15
menit

Tebak dulu, baru lihat angkanya

Angkat tangan sesuai rentang tebakan Anda.

1 Berapa persen proyek software dan hardware yang gagal, menurut studi KPMG atas lebih dari 300 perusahaan besar?

2 Berapa banyak manajer dalam studi itu yang menganggap temuan tersebut normal?

3 Berapa bagian biaya proyek rekonstruksi Afghanistan yang hilang karena pemborosan, kecurangan, dan perencanaan buruk?

KUNCI · DIBUKA SETELAH AKTIVITAS

Angka sebenarnya

65%

proyek software dan hardware gagal

Studi KPMG, 300+ perusahaan besar

1 dari 2

manajer menganggap itu normal

Responden studi yang sama

> 1/3


biaya hilang karena pemborosan

Dari US$110 miliar, laporan SIGAR

Kalau 65% proyek gagal dan itu dianggap wajar, apa insentif seseorang untuk melaporkan masalah lebih awal?

KONSEP · LO 1.4

Siklus hidup proyek

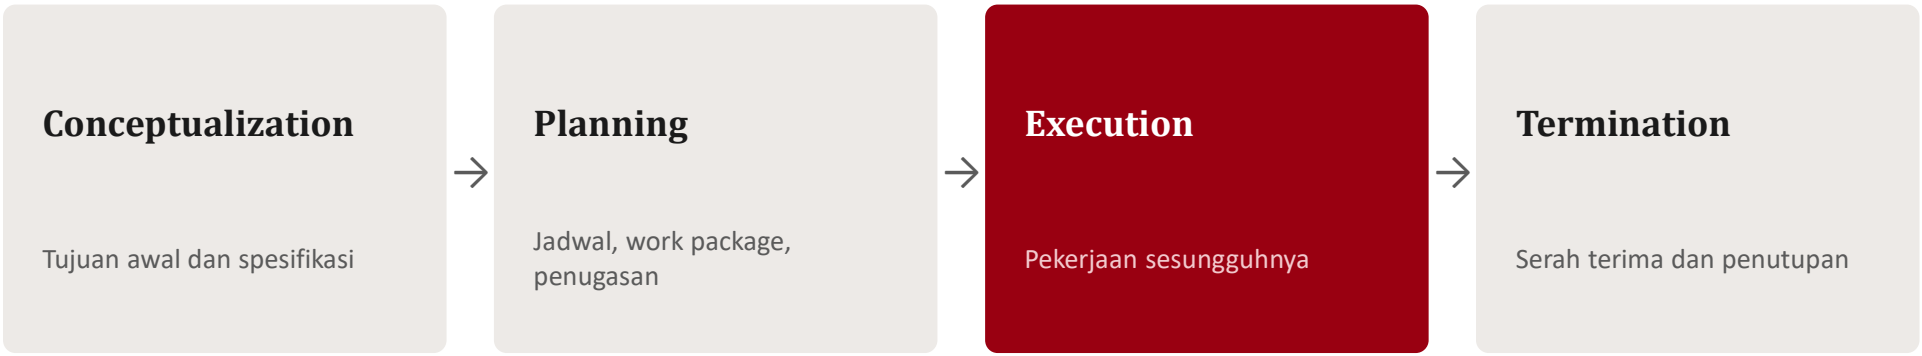

Porsi terbesar anggaran, dihitung dalam man-hours, terserap di fase execution.

Ini persis jawaban soal contoh sertifikasi PMP 1.17 di akhir bab.

AKTIVITAS A5 · MAHASISWA BEKERJA

Gambar kurvanya di papan

20 menit

Lima kelompok, satu variabel per kelompok. Gambar bentuk kurvanya sepanjang empat tahap, lalu jelaskan alasannya dalam 60 detik. Buku boleh dibuka.

Kel. 1	Kel. 2	Kel. 3	Kel. 4	Kel. 5
Uncertainty	**Creativity**	**Resources**	**Project stake**	**Client interest**

Figure 1.5 — sumbu waktu yang sama untuk kelima kolom.

KUNCI · DIBUKA SETELAH AKTIVITAS

Bentuk kurva yang benar

Uncertainty	Tertinggi di awal; tantangan belum teridentifikasi
Creativity	Tinggi di awal, tetap penting selama ketidakpastian tinggi, turun setelah tujuan mengeras
Resources	Naik terus seiring komitmen dana
Project stake	Naik terus; makin lama proyek, makin besar investasi
Client interest	Kurva U: antusias, turun saat pengerjaan, naik lagi mendekati serah terima

Creativity paling sering salah — mahasiswa cenderung menaruhnya tinggi di fase eksekusi.

PERTANYAAN UNTUK KELAS

Melihat kurva uncertainty dan project stake bersamaan, kapan keputusan membatalkan proyek paling murah?

Konsekuensi praktis kurva U: pelanggan yang menghilang selama eksekusi lalu muncul lagi di akhir adalah sumber utama kejutan penolakan hasil.

AKTIVITAS A6 · MAHASISWA BEKERJA

25
menit

Kasus klinik antrean digital

Sebuah tim menyelesaikan sistem antrean digital untuk klinik tepat waktu, di bawah anggaran, dan sesuai seluruh spesifikasi. Enam bulan kemudian, hanya 12 dari 300 pasien per hari yang memakainya.

Berpasangan, 10 menit:

- Nilai proyek ini dengan triple constraint.
- Nilai ulang dengan quadruple constraint.
- Jelaskan mengapa kedua penilaian bisa berbeda.

Setelah selesai: tukar jawaban dengan pasangan lain untuk dinilai silang.

KUNCI · DIBUKA SETELAH AKTIVITAS

Kunci penilaian silang — kasus klinik

2 Triple constraint: sukses. Tepat waktu, di bawah anggaran, spesifikasi terpenuhi.

2 Quadruple constraint: gagal. Client acceptance tidak terpenuhi — 12 dari 300 pasien.

2 Sebabnya: triple constraint hanya mengukur efisiensi internal terhadap spesifikasi awal, dan spesifikasi awal itu sendiri bisa keliru.

1 Nilai tambahan bila menyebut bahwa kriteria pengukuran ditetapkan sebelum proyek dimulai.

Doing the wrong things well.

KONSEP · LO 1.5

Kriteria sukses terus melebar

Triple constraint	Waktu · anggaran · performance
Quadruple constraint	Tambah client acceptance
Shenhar, Levy, Dvir	Efisiensi · dampak ke pelanggan · sukses bisnis · kesiapan masa depan
Atkinson	Iron triangle hanya satu kolom dari empat

What gets measured, gets managed — dan kriterianya ditetapkan sebelum proyek dimulai.

CONTOH · MCKAIN, HLM. 17

Proyek yang dijalankan sempurna bisa tetap salah proyek

Sebuah perusahaan bus wisata hampir menghabiskan dana besar untuk merenovasi interior armadanya. Sebelum mulai, mereka bertanya lebih dulu kepada pelanggan lama.

Faktor terpenting dalam memilih perusahaan bus ternyata sopirnya, bukan interiornya. Proyek renovasi dibatalkan dan diganti program pelatihan sopir.

4 → 1

peringkat di pasar

28 → 56

jumlah armada

Bertanya lebih dulu jauh lebih murah daripada mengerjakan proyek yang salah dengan sempurna.

PENUGASAN

Untuk pertemuan berikutnya

Baca

Case 1.4 — BBC Digital Media Initiative

Semua mahasiswa. Kelompok penanya menyiapkan dua pertanyaan.

Kerjakan

Spider web maturity model (Figure 1.9)

Per kelompok, satu halaman. Nilai satu organisasi yang Anda kenal, skala 0–3, dengan alasan per dimensi.

Baca mandiri

Box 1.2 dan Discussion Question 1.8

Enam kriteria sukses proyek IT versi DeLone dan McLean.

Yang sebenarnya sedang Anda latih

- **Komunikasi**
- **Berpikir kritis**
- **Kolaborasi**
- **Penerapan pengetahuan**
- **Etika bisnis**
- **Teknologi**
- **Literasi data**

PMI menyediakan sertifikasi PMP dan CAPM. CAPM terbuka untuk mahasiswa dan lulusan baru, tanpa syarat pengalaman memimpin proyek yang panjang.
