BAB

# 2

# The Organizational Context

*Strategy, Structure, and Culture*

Pinto, Project Management: Achieving Competitive Advantage, 6th ed.

Manajemen Bisnis · Pertemuan 2

PETA SESI

# Tiga hal di luar kendali Anda yang menentukan nasib proyek

### STRATEGI

Proyek mewujudkan apa yang strategi hanya bisa ucapkan

### STRUKTUR

Fungsional, proyek, atau matriks — masing-masing punya harga

### BUDAYA

Aturan tak tertulis yang menentukan perilaku sebenarnya

**Di antara ketiganya: stakeholder — semua pihak yang kepentingannya harus Anda seimbangkan sekaligus.**

*Konteks organisasi menentukan apakah proyek berkembang atau layu.*

AKTIVITAS A1 · MAHASISWA BEKERJA

10
menit

# Dua pesawat, dua strategi

### AIRBUS → A380

Masa depan ada di megacity dan hub padat. Butuh pesawat raksasa. Target 1.200 unit dalam 20 tahun; sampai 2017 terkirim 193.

### BOEING → 787

Masa depan ada di penerbangan langsung antar banyak kota menengah. Butuh pesawat efisien. Backlog lebih dari 1.100 unit.

▶ **Tonton: “Airbus A380: How Can an Airplane so Good Fail so Spectacularly?” · Wendover Productions**

Sambil menonton, catat dua hal: apa yang Airbus yakini tentang masa depan penerbangan, dan apa yang Boeing yakini.

## Setelah video: kegagalan proyek, atau kegagalan strategi?

KONSEP · LO 2.1 DAN 2.2

# Proyek adalah batu loncatan strategi

*Strategic management: merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi agar organisasi mencapai tujuannya.*

1. Visi dan misi — penyaring pertama untuk peluang proyek
2. Formulasi, implementasi, evaluasi — proyek hidup di tahap implementasi
3. Keputusan lintas fungsi — tempat alami bagi kerja proyek
4. Pencapaian tujuan — efektif di pasar sekaligus efisien di dalam

*Strategi hanya bisa mengartikulasikan. Proyek yang mewujudkan.*

KONSEP · TABEL 2.1

# Setiap strategi meninggalkan jejak berupa proyek

| STRATEGI | | PROYEK YANG LAHIR |
|---|---|---|
| Penetrasi dan penerimaan pasar | → | **Pengembangan produk baru** |
| Efisiensi proses bisnis | → | **Proyek reengineering** |
| Perubahan arah portofolio | → | **Lini produk baru** |
| Aliansi strategis baru | → | **Negosiasi dengan mitra rantai pasok** |
| Menyaingi produk pesaing | → | **Reverse engineering** |
| Koordinasi antar departemen | → | **Concurrent engineering** |

AKTIVITAS A2 · MAHASISWA BEKERJA

20 menit

# Dari TOWS ke daftar proyek

Bertiga. Kalian tim perencana Airbus di tahun 2000, tepat sebelum keputusan A380. Berdasarkan video tadi, isi dua butir per kuadran, lalu turunkan satu proyek konkret untuk tiap kuadran.

**SO** Kekuatan × Peluang

Proyek: _____

**ST** Kekuatan × Ancaman

Proyek: _____

**WO** Kelemahan × Peluang

Proyek: _____

**WT** Kelemahan × Ancaman

Proyek: _____

*Kalau tidak bisa dijawab “kapan selesainya?”, itu strategi — bukan proyek.*

KUNCI · DIBUKA SETELAH AKTIVITAS

# Logika tiap kuadran

| | | |
|---|---|---|
| **SO** | *maxi-maxi*<br>**Pakai kekuatan untuk memaksimalkan peluang** | Ekspansi, produk baru berbasis keunggulan yang ada |
| **ST** | *maxi-mini*<br>**Pakai kekuatan untuk meredam ancaman** | Diferensiasi, penguatan loyalitas pelanggan |
| **WO** | *mini-maxi*<br>**Kurangi kelemahan lewat peluang** | Kemitraan, rekrutmen, pelatihan, adopsi teknologi |
| **WT** | *mini-mini*<br>**Kurangi kelemahan dan hindari ancaman** | Efisiensi, konsolidasi, keluar dari lini merugi |

*Kesalahan paling umum: menuliskan strategi, bukan proyek.*

KONSEP · LO 2.3

# Siapa yang punya kepentingan dalam proyek Anda

*Semua individu atau kelompok yang punya kepentingan aktif dalam proyek dan bisa memengaruhi perkembangannya — positif maupun negatif.*

## INTERNAL

- Top management
- Akuntansi
- Manajer fungsional
- Anggota tim proyek

## EKSTERNAL

- Klien
- Pesaing
- Pemasok
- Intervenor groups

*Mereka tidak sedang bermusuhan. Kepentingannya memang berbenturan secara struktural.*

KONSEP · LO 2.3

# Intervenor groups dan benturan yang tak terhindarkan

## Intervenor groups

Kelompok lingkungan, politik, sosial, komunitas, atau konsumen yang punya kemampuan menyela proyek dan memaksa kepentingannya masuk hitungan. Proyek ladang angin Cape Wind dibatalkan setelah 14 tahun terjerat litigasi.

### Contoh benturan yang khas

| | | |
|---|---|---|
| Tim menerima semua revisi klien | → | **Klien puas** |
| Revisi berulang memakan waktu | → | **Jadwal molor tiga bulan** |
| Jadwal molor dan biaya naik | → | **Top management marah** |

KONSEP · KERANGKA BLOCK

# Enam langkah mengelola stakeholder

1

Assess the environment

2

Identify the goals of the principal actors

3

Assess your own capabilities

4

Define the problem

5

Develop solutions

6

Test and refine the solutions

**Perhatikan betapa terlambatnya “develop solutions” muncul. Kebalikannya: ready, fire, aim — dan manajer proyek berayun dari krisis ke krisis tanpa pernah sampai tujuan.**

AKTIVITAS A3 · MAHASISWA BEKERJA

20 menit

# Peta stakeholder Bandara Kertajati

| Rp2,6 T | 12 juta | 413 ribu | Rp60 M |
|---|---|---|---|
| biaya pembangunan 2015–2018 | target penumpang per tahun 2024 | realisasi penumpang 2024 | kerugian per tahun |

- Proyek Strategis Nasional, bandara terbesar kedua di Indonesia, luas 1.800 hektar
- Seluruh penerbangan domestik dihentikan sementara sejak 2 Juni 2025 karena okupansi rendah
- Akses jalan Tol Cisumdawu yang belum rampung sering disebut sebagai salah satu penyebab
- Sampai Desember 2025: liabilitas jangka pendek Rp474 miliar, jangka panjang Rp1,5 triliun
- Rencana transformasi menjadi Aerospace Park — diversifikasi ke bisnis MRO dan logistik

**▶ Tonton dulu: “Jauh Dari Kota Besar, Bandara Kertajati Sepi Penumpang” · Metro TV — sambil menonton, tulis sebanyak mungkin pihak yang punya kepentingan di sini.**

AKTIVITAS A3 · MAHASISWA BEKERJA

# Yang harus kelompok Anda hasilkan

15 menit

1. Daftar stakeholder internal dan eksternal proyek ini
2. Tandai mana yang berpotensi menjadi intervenor group
3. Temukan dua pasang stakeholder yang tujuannya bertabrakan langsung — tuliskan tabrakannya dalam satu kalimat

*Diskusi kita adalah analisis manajemen proyek — identifikasi stakeholder dan benturan kepentingan — bukan penilaian kebijakan.*

KUNCI · DIBUKA SETELAH AKTIVITAS

# Dua tabrakan yang paling layak dibahas

**Maskapai menunggu rute yang menguntungkan. Bandara butuh maskapai untuk mengisi kapasitas. Keduanya menunggu pihak lain bergerak lebih dulu.**

**Subsidi operasional menjaga bandara tetap hidup, tetapi bersaing dengan kebutuhan anggaran daerah yang lain.**

Pertanyaan penutup untuk kelas: pada fase siklus hidup mana analisis permintaan penumpang dan kesiapan akses jalan ini seharusnya dilakukan?

AKTIVITAS A4 · MAHASISWA BEKERJA

12
menit

# Tonton, lalu kumpulkan amunisi

▶ **Tonton: “Project Management Organizational Structures: Functional, Matrix & Projectized”**

Kelas dibagi tiga. Setiap kelompok membela satu struktur. Sambil menonton, kumpulkan dua kekuatan struktur kalian dan dua kelemahan struktur lawan.

PEMBELA A

## FUNCTIONAL

*Posisi tersulit — dan paling berharga*

PEMBELA B

## PROJECT

*Otoritas penuh, tapi ada harganya*

PEMBELA C

## MATRIX

*Jalan tengah, dengan dua bos*

*Video membahas ketiga struktur, jadi semua kelompok mendapat bahan.*

AKTIVITAS A4 · MAHASISWA BEKERJA

# Sidang tiga struktur

17 menit

**Kasusnya**

Sebuah perusahaan manufaktur berstruktur fungsional kesulitan meluncurkan produk baru tepat waktu. Siklus hidup produknya kini hanya 12–15 bulan.

| | |
|---|---|
| **2 menit** | Tiap kelompok membela strukturnya sebagai solusi |
| **1 menit** | Tiap kelompok membantah kelompok lain |
| **5 menit** | Kelas memutuskan, dosen menutup dengan tabel ringkas |

*Kelompok A punya posisi tersulit: membela “tetap fungsional, perbaiki koordinasinya”.*

KUNCI · DIBUKA SETELAH AKTIVITAS


# Tiga struktur, tiga harga yang berbeda

| | + | − |
|---|---|---|
| **FUNCTIONAL** | Efisien, modal intelektual terjaga, jalur karier jelas | Siloing, kurang fokus pelanggan, proyek lebih lambat |
| **PROJECT** | Otoritas penuh di manajer proyek, keputusan cepat, responsif | Mahal, sumber daya menganggur, modal intelektual bocor |
| **MATRIX** | Cocok lingkungan dinamis, koordinasi lintas fungsi, sumber daya terbagi | Dua bos, waktu habis untuk negosiasi, anggota terjepit |

*Larson dan Gobeli, 1.600+ manajer proyek: efektivitas naik seiring pergeseran ke arah organisasi proyek.*

KONSEP · LO 2.4 LANJUTAN

# Kekuasaan bergeser sepanjang satu garis

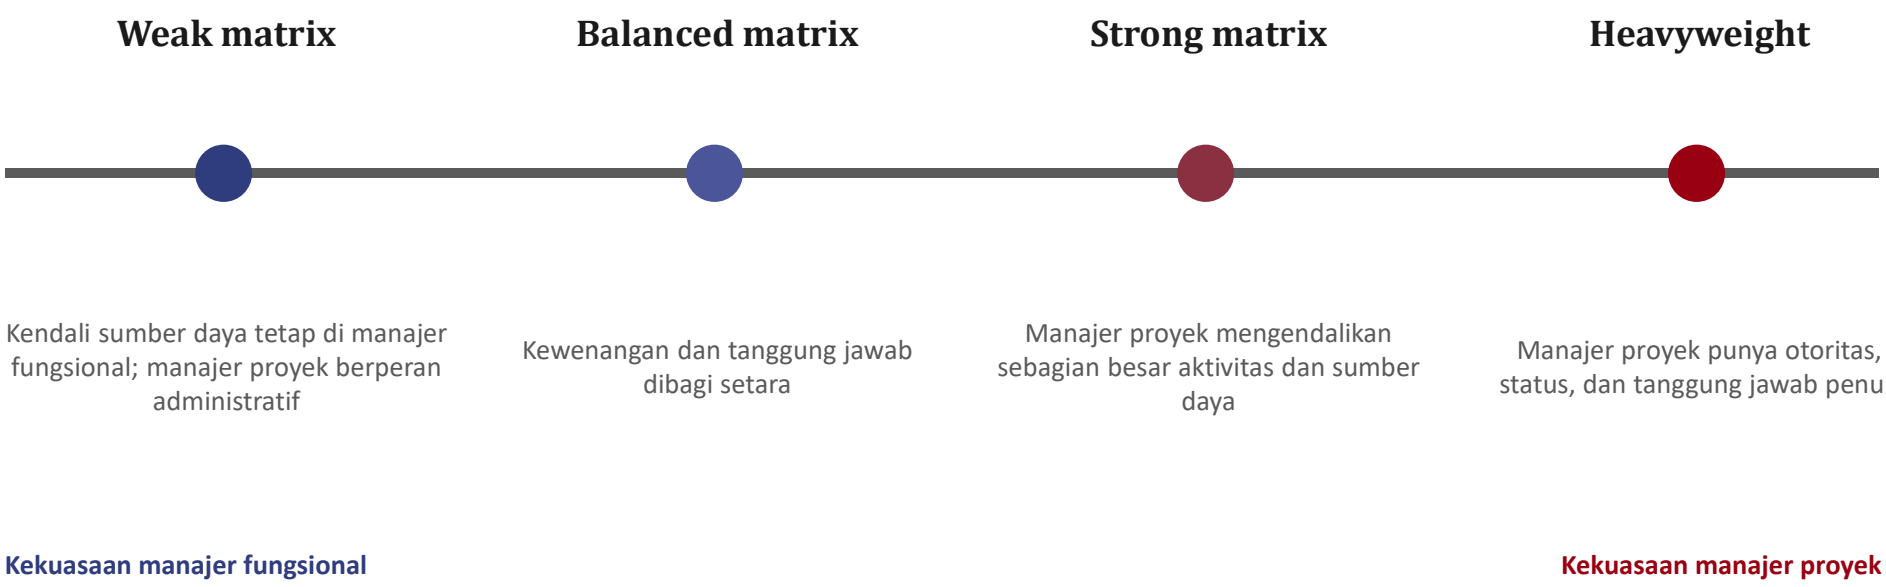

KONSEP · LO 2.5

# Tiga wajah project management office

### Weather station

Memantau dan melaporkan status proyek tanpa berusaha mengendalikannya

**Peran: pengamat**

### Control tower

Menetapkan standar, mendampingi, menegakkan, dan memperbaikinya

**Peran: penjaga mutu**

### Resource pool

Menyediakan dan menjaga kumpulan manajer proyek terlatih

**Peran: penyedia orang**

**Penggolongan lain, berdasarkan derajat kendali: supportive (rendah) · controlling (sedang) · directive (tinggi).**

Kritiknya juga nyata: PMO bisa berubah jadi lapisan birokrasi, dianggap process police, atau menyumbat komunikasi. Siemens menjawabnya dengan sunset clause — setiap PMO dinilai berkala dan dibubarkan kalau tidak lagi berfungsi.

AKTIVITAS A5 · MAHASISWA BEKERJA

# Budaya yang membuat orang diam

23
menit

▶ **Tonton cuplikan: “Boeing’s Fatal Flaw” · FRONTLINE PBS bersama The New York Times**

Cari satu hal: momen di mana seseorang tahu ada masalah, tetapi informasi itu tidak sampai ke tempat yang bisa mengambil keputusan. Catat apa yang menghalanginya.

- Aturan tak tertulis apa yang berlaku di sana, di luar kebijakan resminya?
- Dari tujuh faktor pembentuk budaya, mana yang paling kuat bekerja di sini?
- Apa yang harus berubah supaya kabar buruk bisa naik lebih cepat?

Lanjutan · role-play 5 menit: dua orang maju. Estimasi jujur 80 jam, tapi di kantor ini semua estimasi otomatis dipotong 20 persen. Mainkan percakapannya — tanpa naskah.

KONSEP · LO 2.6

# Budaya adalah aturan yang tidak tertulis di mana pun

*Aturan perilaku tak tertulis, atau norma yang membentuk dan memandu perilaku, yang dianut sebagian anggota organisasi dan diajarkan kepada semua anggota baru.*

TUJUH FAKTOR PEMBENTUKNYA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Teknologi | Lingkungan | Lokasi geografis | **Sistem imbalan** |
| Aturan dan prosedur | Tokoh kunci | Critical incidents | |

**Perusahaan mendapatkan apa yang dibayarnya. Sistem imbalan memberi tahu orang apa yang sebenarnya dihargai, apa pun bunyi kebijakan resminya.**

KONSEP · LO 2.6

# Empat jalur budaya masuk ke proyek Anda

### Interaksi antar departemen

Mau membantu, atau menganggap proyek urusan orang lain

### Komitmen pada tujuan

Berkorban saat dibutuhkan, atau sekadar tidak ketahuan

### Perencanaan proyek

Estimasi jujur, atau estimasi yang sudah dipadatkan lebih dulu

### Evaluasi kinerja

Inisiatif dihargai, atau bermain aman yang dihargai

### Escalation of commitment

Organisasi terus mendanai proyek yang jelas gagal, melewati titik di mana penilaian objektif menyarankan penghentian — sering karena tidak sanggup mengakui kegagalan. Ingat A380. Ingat Kertajati.

PENUGASAN

# Untuk pertemuan berikutnya

**Baca**

### Case 2.4 — Widgets 'R Us

Semua mahasiswa. Tiap kelompok mempertahankan satu bentuk struktur sebagai solusi, termasuk opsi “tetap fungsional”.

**Kerjakan**

### TOWS dan peta stakeholder organisasi pilihan Anda

Soal C1 dan C2. Satu halaman, dikumpulkan sebelum kelas.

**Baca mandiri**

### Case 2.2 — Xerox Alto

Strategi, struktur, dan budaya dalam satu cerita. Siapkan pendapat untuk pertanyaan nomor 4.

# Yang harus terbawa keluar kelas

| | |
|---|---|
| **Strategi** | Proyek adalah batu loncatan; TOWS menghubungkan keduanya |
| **Stakeholder** | Kepentingan berbenturan secara struktural, bukan karena niat buruk |
| **Struktur** | Fungsional, proyek, matriks — tiap bentuk punya harga sendiri |
| **Budaya** | Aturan tak tertulis menentukan perilaku yang benar-benar terjadi |

*Bab berikutnya: bagaimana organisasi memilih proyek mana yang dijalankan.*
