BAB

3

Project Selection and Portfolio Management

Pinto, Project Management: Achieving Competitive Advantage, 6th ed.

Manajemen Bisnis · Pertemuan 3

PETA SESI

Empat hal yang harus terbawa keluar kelas

01

Enam kriteria model penyaringan

Realism, capability, flexibility, ease of use, cost, comparability

02

Empat metode non-finansial

Checklist, scoring, AHP, profile model

03

Empat model finansial

Payback, NPV, discounted payback, IRR

04

Portfolio management

Proses seleksi dan matriks portofolio

Memilih proyek yang salah dengan metode yang rapi tetap menghasilkan proyek yang salah.

AKTIVITAS A1 · MAHASISWA BEKERJA

22
menit

Otopsi Quibi

$1,75 M
dana terkumpul sebelum peluncuran

7,4 juta
target pelanggan tahun pertama

~500 ribu
realisasi saat ditutup

6 bulan
umur layanan

▶ **Tonton: “The $1.75B App Nobody Wanted — Quibi’s Epic Failure”**

Sambil menonton, catat satu hal: apa yang seharusnya ditanyakan seseorang sebelum uang itu dikeluarkan?

Investornya Disney, Alibaba, Sony, Goldman Sachs. Pendirinya mantan ketua Walt Disney Studios dan mantan CEO eBay.

KONSEP · LO 3.1

Enam kriteria model penyaringan yang baik

Realism

Mencerminkan tujuan dan kendala nyata; menimbang risiko komersial dan teknis

Capability

Cukup lentur untuk membandingkan jenis proyek yang berbeda

Flexibility

Mudah diubah ketika kondisi berubah

Ease of use

Sederhana, cepat, bisa dipakai lintas fungsi tanpa pelatihan khusus

Cost

Murah — model yang mahal akan dihindari orang dan jadi sia-sia

Comparability

Cukup luas untuk membandingkan banyak proyek sekaligus

Pareto: kurang dari 20% kriteria menentukan lebih dari 80% keputusan. Jangan buat model dengan 40 kriteria.

AKTIVITAS A2 · MAHASISWA BEKERJA

20 menit

Bangun model yang akan menolak Quibi

Bertiga. Kalian komite seleksi proyek di sebuah perusahaan media.

1. Susun lima kriteria dengan bobot 1–5
2. Nilai Quibi dengan skala 1 = rendah, 2 = sedang, 3 = tinggi
3. Hitung skor tertimbang — hasilnya harus menolak Quibi

Syaratnya: kalian harus bisa menjelaskan mengapa kriteria itu wajar dipakai — bukan dipilih supaya hasilnya cocok.

KONSEP · LO 3.2

Dari checklist ke scoring model

CHECKLIST

- Daftar kriteria, nilai tinggi / sedang / rendah
- Sederhana dan memancing diskusi kelompok
- Lemah: penilaian subjektif
- Lemah: semua kriteria dianggap sama penting


SCORING MODEL

- Menambahkan bobot pada tiap kriteria
- Mencerminkan kriteria mana yang lebih penting
- Lemah: arti angka 3, 2, 1 tak pernah presisi
- Lemah: hasil sangat sensitif terhadap bobot

AHP: empat langkah, lebih akurat, tapi menuntut semua kriteria dibuka di awal — yang sering ditolak pemilik agenda politik.

KONSEP · LO 3.2

Profile model dan efficient frontier

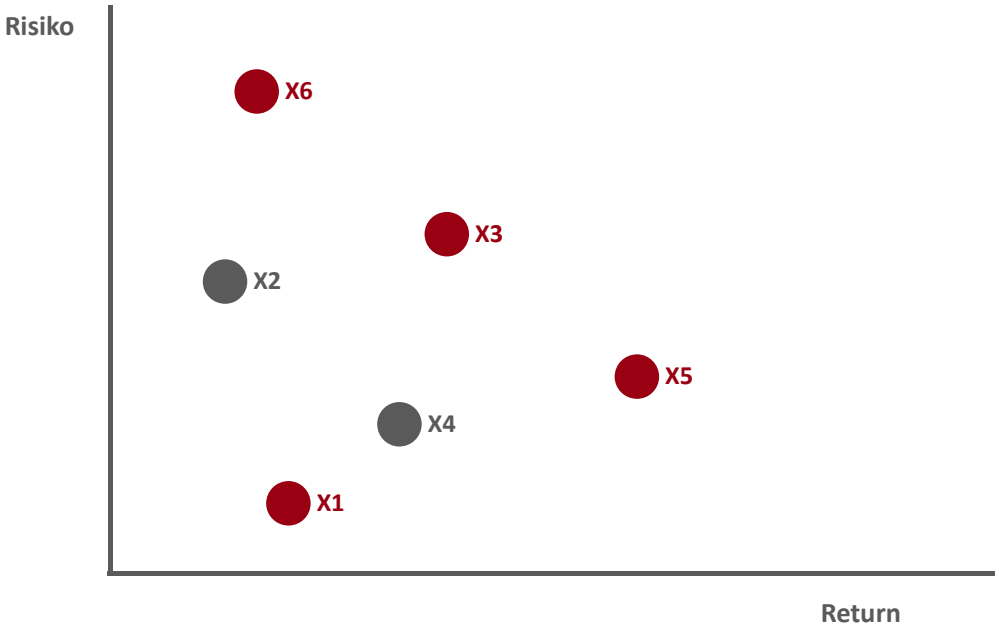

Merah = di garis efficient frontier · abu = pilihan inferior

Aturan bacanya dua kalimat

Dengan return sama, pilih risiko lebih rendah.

Dengan risiko sama, pilih return lebih tinggi.

Dua kelemahannya: hanya dua kriteria yang dipakai, dan risiko sering sulit dikuantifikasi secara jujur.

AKTIVITAS A3 · MAHASISWA BEKERJA

20
menit

Dua proyek, dua jawaban berbeda

▶ **Sudah menonton: “Capital Budgeting: NPV, IRR, Payback” · Required rate of return 12% · angka dalam juta rupiah**

Tahun	Melati	Kenanga
0	(400)	(400)
1	100	50
2	150	100
3	200	250
4	150	300

- Hitung payback period untuk keduanya
- Hitung NPV untuk keduanya
- Putuskan: mana yang Anda danai, dan mengapa?

Perusahaan hanya punya dana untuk satu proyek.

KUNCI · DIBUKA SETELAH AKTIVITAS

Ketika dua alat menunjuk arah berbeda

	Melati	Kenanga
Payback period	**2,75 tahun**	**3,00 tahun**
NPV pada 12%	**+46,5 juta**	**+93,0 juta**

Melati menang di payback. Kenanga menang di NPV, hampir dua kali lipat.

- Payback mengukur seberapa cepat uang kembali — bukan seberapa besar nilainya
- Payback mengabaikan seluruh arus kas setelah titik impas, dan nilai waktu uang
- Payback tetap relevan saat likuiditas ketat atau angka tahun jauh tak bisa dipercaya

Bukan “payback itu buruk” — tapi “payback menjawab pertanyaan yang berbeda”.

KONSEP · LO 3.3

Discounted payback dan IRR

Discounted payback

Investasi 150 juta, masuk 50 juta per tahun, RRR 10%.

Payback sederhana: tepat 3,00 tahun.
Setelah didiskon: 45,5 — 41,3 — 37,6 — 34,2
Discounted payback: sekitar 3,75 tahun.

IRR

Tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan nol.

Terima kalau IRR ≥ hurdle rate perusahaan.

Dua jebakannya: peringkat bisa berbeda dari NPV pada proyek yang tidak saling bebas, dan bisa muncul lebih dari satu solusi bila arus kas tidak normal.

Model finansial yang dipakai sendirian tidak menghasilkan portofolio yang optimal.

GIGO — garbage in, garbage out. Angka yang dipelintir sampai enak dilihat tetap menghasilkan keputusan buruk, hanya saja sekarang terlihat meyakinkan.

AKTIVITAS A4 · MAHASISWA BEKERJA

17
menit

Kenapa harus punya banyak proyek sekaligus

▶ **Tonton: “Understanding the Drug Development Pipeline” (9 menit)**

Sambil menonton, catat dua hal: berapa lama satu obat baru butuh waktu sampai bisa dijual, dan berapa banyak kandidat yang gugur di jalan.

12–16 tahun

total waktu pengembangan

< 0,002%

peluang sukses keseluruhan

Kalau peluang suksesnya di bawah 0,002 persen, mengapa perusahaan farmasi tidak bangkrut?

KONSEP · LO 3.4

Empat jenis proyek dalam portofolio

PEARLS

Teknis mudah, komersial besar

Teknologi yang sudah dipahami dipakai untuk aplikasi baru bernilai tinggi

OYSTERS

Teknis sulit, komersial besar

Teknologinya belum terbukti, tapi kalau berhasil hadiahnya besar

BREAD AND BUTTER

Teknis mudah, komersial sedang

Perbaikan bertahap: rilis baru sebuah aplikasi, produk “baru dan lebih baik”

WHITE ELEPHANTS

Teknis sulit, komersial kecil

Tidak pernah dipilih sengaja — lahir dari proyek lain yang tak menepati janji

Sumbu datar: kelayakan teknis. Sumbu tegak: potensi komersial.

AKTIVITAS A5 · MAHASISWA BEKERJA

10
menit

Berburu white elephant

Berpasangan. Sebutkan satu white elephant yang kalian kenal — di kampus, di organisasi kalian, di tempat kerja orang tua, atau di proyek publik.

Lalu jawab satu pertanyaan: alasan apa yang dipakai untuk mempertahankannya?

“Sudah terlanjur banyak keluar biaya untuk menghentikannya sekarang.”

“Proyek itu didukung orang penting di organisasi.”

Dua alasan ini hampir selalu muncul — dan keduanya ada di buku. Ingat escalation of commitment dari Bab 2.

PENUGASAN

Untuk pertemuan berikutnya

Baca

Case 3.1 — Keflavik Paper Company

Fokus pada pertanyaan 1: kalau ketergantungan pada DCF menimbulkan masalah ini, metode lain menimbulkan masalah apa?

Kerjakan

Soal C2 dan C3 — payback, NPV, discounted payback

Bawa langkah perhitungannya, bukan hanya jawabannya.

Kelompok

Portofolio program kerja organisasi kalian

Scoring model, matriks portofolio, dan satu alasan mengapa rekomendasi kalian akan sulit diterima.

Yang harus terbawa keluar kelas

Kriteria	Model yang baik: realistis, lentur, murah, dan bisa dibandingkan
Metode	Checklist, scoring, AHP, profile — masing-masing punya titik butanya
Angka	Payback dan NPV bisa menunjuk arah berbeda; NPV lebih dipercaya
Portofolio	Jangan bertaruh pada satu home run; buru white elephant secara berkala

Bab berikutnya: manajer proyek — orang yang harus menjalankan pilihan ini.
